

تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة

2022-2017



جماعة القصر الكبير شتنبر 2019

الإطار المرجعي :

لقد شكل القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات نقلة نوعية في مجال تدبير الجماعات الترابية سواء على مستوى التسيير أو على مستوى الاختصاصات أو على مستوى الآليات المعتمدة من أجل تحقيق التنمية المحلية والعدالة المجالية، حيث أكد أن تدبير الجماعة لشؤونها عبر تقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنات يركز على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة في حدود اختصاصاتها ، سلطة التداول في شؤونها بكيفية ديمقراطية،

كما جعل التنظيم الجماعي يركز على مبدئي التضامن والتعاون بين الجماعات وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها، وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

ولهذه الغاية، تمارس الجماعة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.

في هذا السياق يعتبر برنامج عمل جماعة القصر الكبير باعتباره اختصاصا ذاتيا للجماعة ثمرة عمل تشاركي بهدف التأسيس لبناء نموذج تنموي محلي ديمقراطي يستجيب لتطلعات المواطنين، و يعكس الإرادة الجماعية والتجربة المشتركة للفاعلين، بهدف تكوين رؤية مشتركة لمستقبل الجماعة، مبنية على التشاور و التفاوض المستمر للفاعلين المحليين وبناء شراكات مستدامة و مؤثرة تأخذ بعين الاعتبار استراتيجيات التدخل على المستوى المحلي و باقي المستويات. مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي ومقاربة النوع.

ولتنزيل هذا التميرين التشاركي والتشاورى، تم اتخاذ قرار رقم 05 بتاريخ 11 أكتوبر 2016 يتعلق بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و بناء على المرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه و تحيينه و آليات الحوار و التشاور لإعداده.

حيث نصت المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بكون الجماعة تضع برنامج تنمية الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، مؤكدة أن هذا البرنامج يجب أن يتضمن الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات. بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية و وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللامركزية للإدارة المركزية.

حيث يحدد برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد أولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

وتهدف هذه الوثيقة إلى توفير جميع شروط التنمية المحلية وضمن الالتقائية والانسجام مع البرامج القطاعية الوطنية وكذا برنامج التنمية الإقليمية وبرنامج التنمية الجهوية في أفق

تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية وتحقيق العدالة المجالية المرجوة ، فهذا البرنامج يشكل الأساس المتين لدعم اللامركزية و الديمقراطية المحلية، ومقدمة أساسية للمساهمة في بناء ورش الجهوية الموسعة واختبار حقيقي لورش اللاتركيز الإداري.

منظومة تتبع وتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة القصر الكبير 2017-2022

طبقا لمقتضيات المادة 13 و 14 من المرسوم 2.16.301 يتولى رئيس المجلس الجماعي تنفيذ وإعداد تقرير سنوي يهدف إلى تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة .

وتطبيقا لمقتضيات المادة 15 من المرسوم السالف الذكر الذي ينص على عرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي بخصوصه وذلك داخل أجل ثلاثين يوما على أن يتدارس مجلس الجماعة هذا التقرير في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها.

وتعتمد منظومة تدبير وتتبع برنامج عمل جماعة القصر الكبير وتقييم نسبة إنجاز مشاريعه على المراحل التالية :

المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة	المرحلة الرابعة	المرحلة الخامسة	المرحلة السادسة	المرحلة السابعة
المصادقة على برنامج عمل الجماعة	عقد اتفاقيات الشراكة	عملية الترويج للمشاريع	لجنة المتبع	التقارير	استراتيجية عملية التواصل والإعلام	تأثير المشاريع المنجزة
يجب اعتماد برنامج عمل الجماعة تطبيقا للقوانين والأحكام المنصوص عليها	سيتم إتمام عقود الشراكة المبرم بين مختلف الشركاء تحت رعاية عمالة العرائش و التي تحتوي على وجه الخصوص على طبيعة التدخل، ملاحظات والتكلفة	عملية الترويج للمشاريع المختارة يجب أن تكون على نطاق واسع من طرف جميع الشركاء المحتملين لضمان تحقيقها في أفضل الظروف	1- تدريب أطر الجماعة 2- لجنة المتبع: - العمالة - الجماعة - المصالح المعنية - المجتمع المدني	إنجاز تقارير دورية منتظمة من طرف الشركاء المسؤولين عن تنفيذ المشاريع في إطار عقود الشراكة	بعد الانتهاء من إنجاز المشاريع طبقا للمعايير يجب تعميم المشاريع على الشركاء قصد تقييمها أو تحيينها إن اقتضى الأمر	ستضع لجنة المتبع تقارير ردود المشاريع المنجزة وتقييم وقعها ونفعها على الساكنة والاقتصاد المحلي والمجال البيئي للجماعة

انسجاما مع القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و بناء على المرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه و تحيينه و آليات الحوار و التشاور لإعداده. عملت الجماعة على عرض مشروع برنامج عمل جماعة القصر الكبير برسم 2017-2022 على أنظار اللجن الدائمة للمجلس بتاريخ 29 غشت 2017 ، وبعد استكمال مرحلة اللجن تم عرضه على أشغال الدورة العادية لأكتوبر 2017، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع بمقتضى مقرر المجلس عدد 1336/88 بتاريخ 05 أكتوبر.

وبعد عرضه على أنظار هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، و عقد سلسلة من اللقاءات التواصلية والتشاورية مع جمعيات المجتمع المدني والسكان المحلية وبموازاة مرحلة التأشير طبقا للقوانين المنظمة ، قامت رئاسة المجلس ببذل جميع المجهودات من أجل تنزيل مضامين هذه الوثيقة المرجعية في مجال التنمية المحلية والترايبية. عبر الترافع لدى مختلف الشركاء المحتملين والفاعلين المؤسساتيين عبر مختلف القنوات والمواقع المتاحة (رئاسة المجلس / المجلس الإقليمي /الجهة/ البرلمان/ السلطات المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية/الإعلام،..) في أفق عقد شراكات والبحث عن التمويلات الضرورية من أجل تنزيل البرامج و المشاريع الواردة في برنامج عمل الجماعة، أو من خلال حث القطاعات الحكومية على إنصاف مدينة القصر الكبير عبر تنزيل مجموعة من المشاريع التنموية المندمجة بالمدينة لتساير المجهود التنموي الذي تعرفه جهة طنجة- تطوان- الحسيمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.


لقد شكل تمرين تنزيل برنامج عمل الجماعة، تحديا كبيرا لدى مجلس جماعة القصر الكبير باعتباره تجربة جديدة في التسيير والتدبير الجماعي، تعتمد على التتبع والتقييم الذاتي والتدبير المبني على النتائج ،كما شكل مناسبة لاختبار مدى التزام القطاعات الحكومية وجديتها في دعم مسلسل التنمية المحلية وتكريس مزيد من العدالة المجالية،عبر تنفيذ البرامج ذات الأولوية و الملتمزم بها من خلال برنامج عمل الجماعة للقصر الكبير.حيث تم تسجيل مجموعة من الإكراهات سواء على مستوى الالتزام بتنفيذ المشاريع أو تعقد مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لتوفير العقارات الضرورية لتوطين المشاريع ، وكذا على مستوى مد الجماعة بالمعلومات الضرورية لتقييم تنفيذ المشاريع الواردة ببرنامج عمل الجماعة ،حيث عملت هذه الأخيرة على إخراج هذا التقرير بالإمكانات الذاتية و وفق المعطيات المتاحة والمتوفرة رغم مراسلة الجهات المختصة لأكثر من مرة.

جدادة تتبع المشاريع


الحلول المقترحة	الأكراهات التي تحول دون انجاز المشروع في أجاله	مبلغ الصفقة	الغلاف المرصود (PAC)	نسبة الانجاز المالي	نسبة الانجاز المادي للمشروع (تقدم الأشغال)	المشروع
البنية التحتية						
			11.000.000,00			تتمة مشروع تهيئة أشغال مدخل مدينة القصر الكبير من جهة طريق العرائش (من قنطرة وادي لوكوس إلى محطة الوقود السلامة)
تم التحويل بعد استيفاء الشروط و المساطر المعمول بها	تحويل الياف الاتصالات وقاية أنبوب الماء الصالح للشرب الغير المتوقعة بالصفقة	43.700.000,00			95%	بناء قنطرة مزدوجة
	تأخر الإفراج عن اعتمادات الأداء	12.374.280,00	13.000.000,00	%70	%80	مشروع تهيئة المدخل الشمالي لمدينة القصر الكبير (أولاد احمايد)
		340.000,00	15.000.000,00	%33	50%	- تتمة مشروع تهيئة أشغال مدخل مدينة القصر الكبير من جهة طريق الرباط (قنطرة واد المخازن الى طريق الوطنية رقم 1) دراسة إعادة بناء قنطرة ب ن ك 9+800 ط ! 4404
			150.000.000,00		الدراسة التقنية	مشروع إعادة هيكلة أزقة وشوارع أولاد احمايد
	تحويل ألياف الاتصالات اقتناء بعض العقارات	19.500.000,00	24.000.000,00	%10	%40	المعالجة البيئية وأماكن انزلاق على مستوى الطريق RR410 48+000/44+000/42+400/40+500/34+000/25+000/24+60 0 /PK23+100
		39.000.000,00	54.000.000,00	%5	%25	تقوية الطريق RR410 على مستوى: PK2+000 إلى PK60+000
	تأخر تحويل المساهمات المالية/ شبكات التطهير	12.800.082,00	100.000.000,00	%13.30	%70	أشغال الطرق وتهيئة الأرصفة بالمدينة أشغال بناء الطرق

		12.294.609,60		%54,63	%90	أشغال بناء الطرق (الشطر الثاني)
		4.983.000,00		%95,60	100%	أشغال تهيئة أحياء المدينة بالأحجار المرصفة(حي المسيرة-دار الدخان- حي سيدي رضوان – بلاد الطود – طريق العرائش- حي الشريعة – حي السلالين)
		7.035.000,00		70,70%	100%	أشغال تهيئة أحياء المدينة بالأحجار المرصفة (حي السلام)
		5.649.000,00		%0	%50	تهيئة أحياء المدينة بالأحجار المرصفة (حي بقوش – بن حدو)
		6.190.020,00		%0	70%	تهيئة أحياء المدينة بالأحجار المرصفة (بنحدو)
		5.365.452,00		%0	50%	تهيئة أحياء المدينة بالأحجار المرصفة (حي بوشويكة)
		5.890.600,80		100%	100%	أشغال تهيئة حي السلام (بلاد بنحدو- بلاد بكوش بلاد بوشويكة – بلاد زبيدة – الحي الجديد) بالأحجار المرصفة
		1.406.496,0		100%	100%	تهيئة أرصفة أحياء المدينة (المحلة – قرب سوق للرقية)
		1.332.000,00		%0	100%	أشغال تهيئة الشوارع الرئيسية
		6.569.400,00		100%	100%	تهيئة أحياء المدينة بالأحجار المرصفة
		930.000,00		100%	100%	أشغال تهيئة حي المسيرة بالأحجار المرصفة
		2.491.200,00		100%	100%	أشغال تهيئة أحياء المدينة بالأحجار المرصفة (حي السلام - بلاد الصرصري- حي أولاد احمايد)
		2.818.380,00		100%	100%	أشغال تهيئة أحياء المدينة (بلاد الريسوني - حي أولاد احمايد – بلاد الهوري- حمرية – برطلو – حومة الرد –حي المسيرة الخضراء)
		1.343.400,00		%0	100%	أشغال تهيئة أرصفة أحياء المدينة

		3.285.870,00		%76	%90	أشغال تهيئة أرصفة أحياء المدينة
		2.825.700,00		%87	100%	أشغال تهيئة أحياء المدينة بالأحجار المرصفة (حي أولاد احمايد- بلاد الصرصري- برطلو- حي السلام)
		1.879.800,00		%0	100%	أشغال تهيئة أحياء المدينة بالأحجار المرصفة (المنابك - الفرفرة- مطيمر)
		9.277.620,00	40.000.000,00	100%	100%	أشغال الإنارة العمومية بالمدينة
		7.998.000,00		100%	100%	تجديد شبكة الكهرباء بمختلف شوارع المدينة
		278.220,00		%71	100%	تمديد شبكة الإنارة العمومية
		434.220,00		%0	80%	أشغال الإنارة العمومية لملاعب القرب أولاد احمايد
		377.016,00		%0	%0	أشغال الإنارة العمومية بالمدينة العتيقة
			1.000.000,00		إعداد الصفحة	دراسة للسير والجولان بمدينة القصر الكبير
		1.306.080,00		%0	100%	التشوير الأفقي وتحديد السرعة

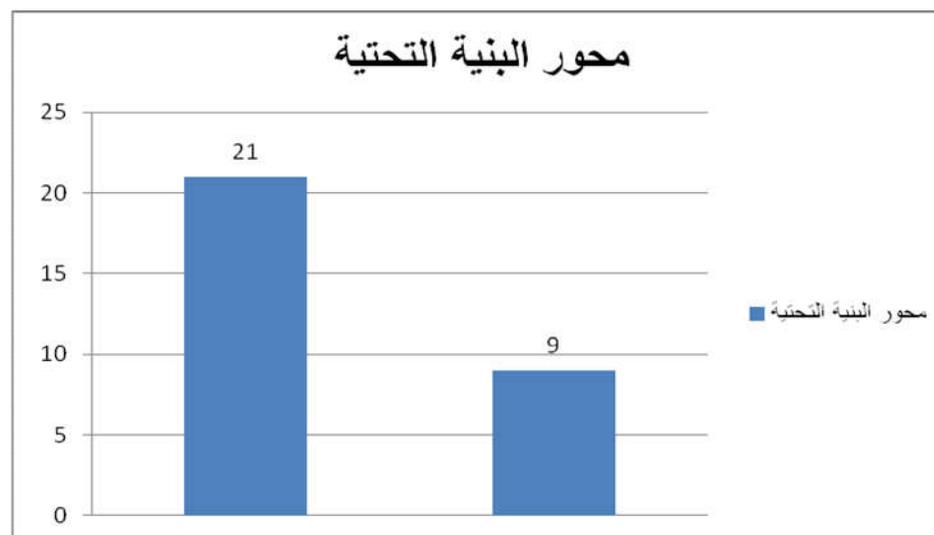

في إطار تنزيل الجماعة لبرنامج عمل الجماعة على مستوى البنية التحتية بلغ عدد المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز 9 مشاريع من أصل 21 مشروعا واردا ببرنامج عمل الجماعة أي بنسبة إنجاز تصل إلى 43%. بمبلغ استثماري ناهز حوالي 207.301.166,40 درهم حيث خصصت لأشغال الطرق وتهيئة الأرصفة مبلغ 85.090010,40 درهم.

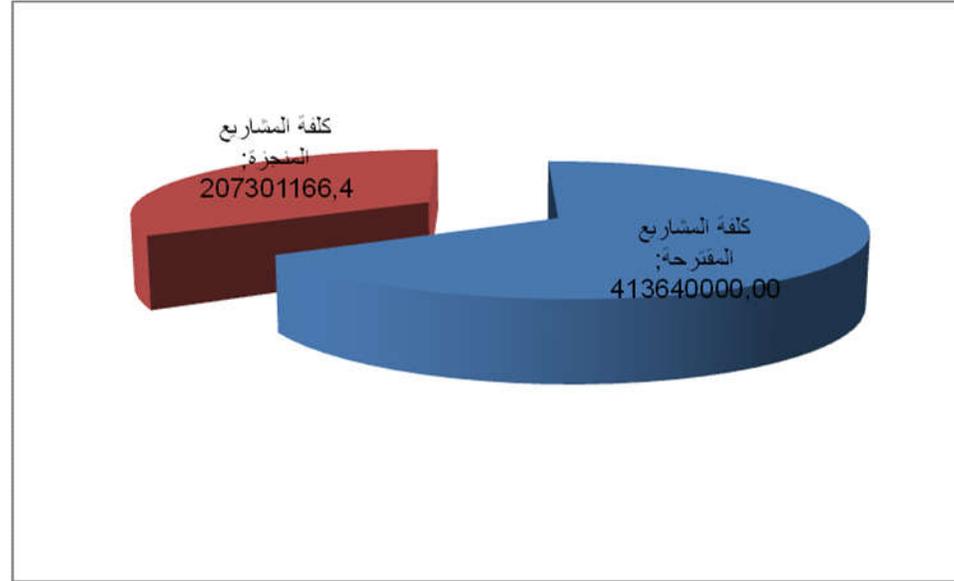



تهيئة مدخل المدينة جهة طريق العرائش



تهيئة الأرصفة بالزليج



تهيئة مدخل المدينة جهة طريق العرائش



ترصيف مدخل المدينة



ترصيف أحياء المدينة بالأحجار المصففة





ترصيف أحياء المدينة بالأحجار



تعبيد الطرق


الحلول المقترحة	الاكراهات التي تحول دون انجاز المشروع في أجاله	مبلغ الصفقة	الغلاف المرصود (PAC)	نسبة الانجاز المالي	نسبة الانجاز المادي للمشروع (تقدم الأشغال)	المشروع
التعمير						
			-		طور الإنجاز	مشروع توسيع المدار الحضري للمدينة
					تمت موافاة الجماعة بنسخة من دراسة الميثاق الهندسي و المشهدي للمدينة	وضع دراسات معمارية
استخراج المساحات البورية والسقوية التابعة للكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي من مدار التهيئة	تواجد المناطق البورية و السقوية داخل مدار التهيئة		600.000,00		طور الإنجاز (انتظار موافاة الوكالة بالموافقة النهائية لمصالح الفلاحة)	تمكين المدينة من التغطية بتصميم التهيئة مصادق عليه
			60.000.000,00		طور الإنجاز إعداد ملف التصنيف	أشغال ترميم وإعادة هيكلة المدينة القديمة وتصنيف بعض البنايات الأثرية المتميزة
			500.000,00		طور الإنجاز إعداد ملف التصنيف	العمل على تصنيف المدينة العتيقة كتراث عالمي وضع تصور شمولي لصيانة إعادة تهيئة استعمال مآثر ظهر المحلة إحداث ممرات تاريخية للزائرين قصد اكتشاف مآثر المدينة و تشجيع السياحة الثقافية

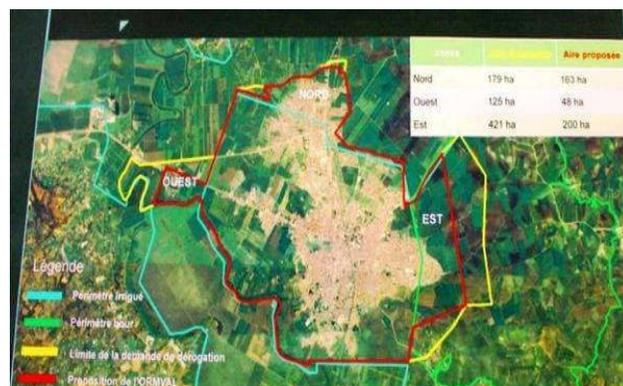

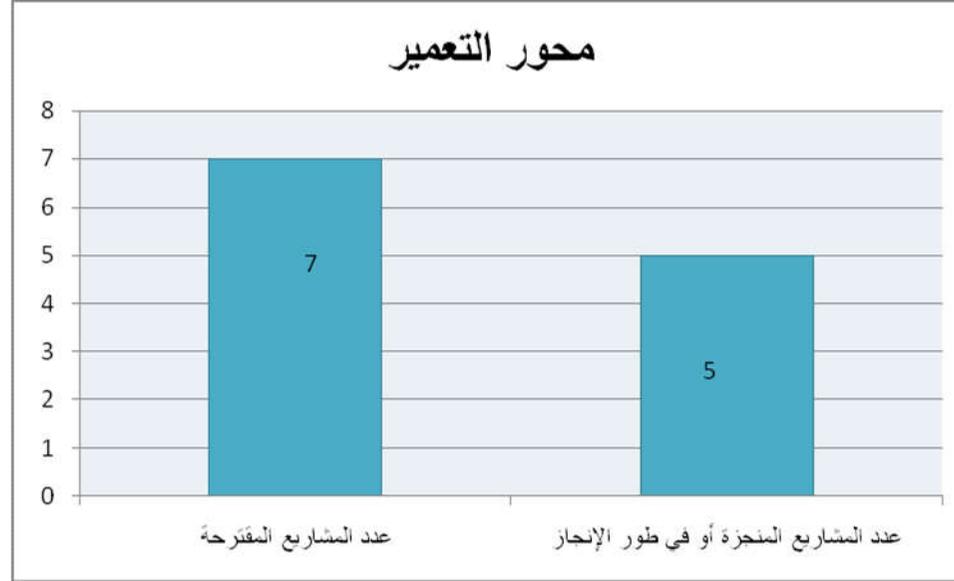

في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة على مستوى التعمير، بلغ عدد المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز 5 مشاريع من أصل 7 مشاريع واردة ببرنامج عمل الجماعة أي بنسبة إنجاز تصل إلى 71%.

المشروع	نسبة الانجاز المادي للمشروع(تقدم الأشغال)	نسبة الانجاز المالي	الغلاف المرصود (PAC)	مبلغ الصفقة	الاكراهات التي تحول دون انجاز المشروع في أجاله	الحلول المقترحة
المجال الاقتصادي						
مشروع إعداد منطقة الأنشطة الاقتصادية (المهن المزعجة)	نزع الملكية من أجل المنفعة العامة		17.000.000,00			
مشروع بناء سوق السمك	40%	%0	5.000.000,00	4.511.617,20		
مشروع إحداث سوق نموذجي ببلاد الزواك(2+1)	تم الإعلان عن الصفقة		16.625.544,00	16.625.544,00		
مشروع إحداث سوق نموذجي لاستيعاب الباعة المتجولين (رحبة اللين)						
مشروع تأهيل وإعادة هيكلة السوق اليومي لالة رقية	40%	%0	2.092.722,00	2.092.722,00		
مشروع تأهيل وإعادة هيكلة سوق سيدي بواحمد						
مشروع تأهيل وإعادة هيكلة السوق اليومي رحبة اللين						
مشروع تأهيل وإعادة هيكلة السوق المركزي	طور الإنجاز		4.501.503,00	4.501.503,00		
مشروع إحداث منطقة صناعية بالمدينة من الجيل الجديد إقتراح 77	طور الإنجاز		200.000.000,00			
هكتار دراسة الجدوى الدراسة	100%			450.000,00		
	100%	0%		50.000,00		

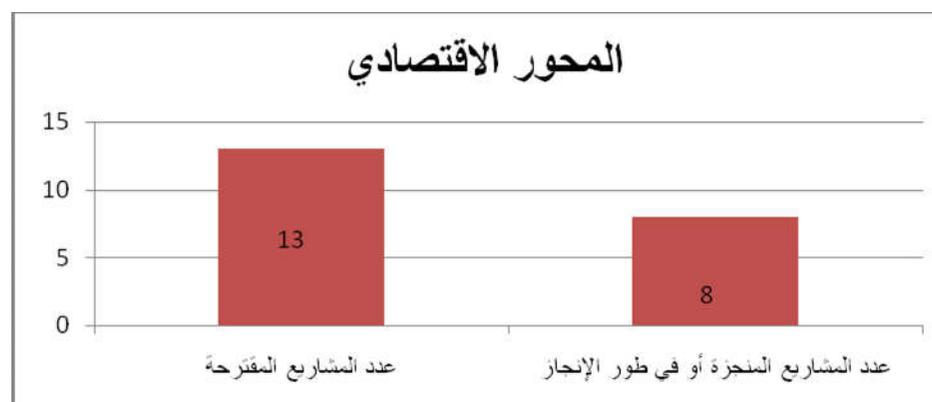

أما على مستوى الاقتصادي فقد بلغ عدد المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز 8 مشاريع من أصل 13 مشروعا واردا ببرنامج عمل الجماعة أي بنسبة إنجاز تصل إلى %61,53، بمبلغ استثماري ناهز حوالي 28.181.386,20 درهم .



ورش أشغال تهيئة سوق السمك اولاد احمايد




تهيئة سوق السمك اولاد احمايد



السوق المركزي

المشروع	نسبة الانجاز المادي للمشروع (تقدم الأشغال)	نسبة الانجاز المالي	الغلاف المرصود	مبلغ الصفقة	الاكراهات التي تحول دون انجاز المشروع في أجاله	الحلول المقترحة
المجال الاجتماعي						
مشروع إحداث مركز لذوي الاحتياجات الخاصة	طور الإنجاز (الدراسة) توقيع الاتفاقية مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية		6.000.000,00			
مشروع إحداث مكتبة احسيسن (قبالة المنصور الذهبي)	طور الإنجاز وضع حجر الأساس		6.000.000,00	6.062.365,20		
مشروع هدم وإعادة بناء مركز الجمعية العلوية للمكفوفين	طور الإنجاز (الدراسة التقنيّة والمعمارية)		3.000.000,00			
مشروع إحداث مكتبة الضحاك	100%		10.000.000,00			
مشروع إحداث مركز التأهيل الفلاحي	طور الإنجاز		30.000.000,00			
مشروع ترميم مدرسة بن خلدون	40%		4.300.000,00	3818190,00		
مشروع بناء كلية متعددة التخصصات	انطلاق الاشغال		100.000.000,00			
مشروع الأشغال الكبرى لتهيئة المؤسسات التعليمية بالمدينة مشروع إتمام السكن الوظيفي تهيئة الساحة والملاعب الرياضية بمدرسة وادي الذهب مشروع أشغال تهيئة الفضاءات الخارجية بمدرستي المسيرة الخضراء والمنزه مشروع أشغال تهيئة الفضاءات الخارجية بمدرسة بنر انزران	تم فتح الأظرفة بتاريخ 2018/09/12 في طور المصادقة على الصفقة في طور المصادقة على الصفقة		16.200.000,00	487.200,00 360.780,00 240.000,00		
مشروع أشغال توسعة وتعويض بعض المؤسسات التعليمية بالمدينة مشروع بناء سور بمدرسة جابر بن حيان مشروع أشغال بناء سور بالثانوية الإعدادية أبي المحاسن مشروع أشغال بناء سور بمدرسة عبد الله الشفشاوني	تم فتح الأظرفة بتاريخ 2018/09/12 في طور المصادقة على الصفقة في طور المصادقة		11.500.000,00	699.000,00 379.200,00 298.200,00		

		170.000,00			في طور المصادقة	مشروع أشغال المساعة بمدرسة المسيرة الخضراء
		213.322,00			في طور المصادقة على الصفقة	مشروع أشغال المساعة بالثانوية الإعدادية الإمام مسلم
		5.388.876,00	5.580.000,00		في طور المصادقة على الصفقة	مشروع بناء المدرسة الابتدائية الفردوس بتجزئة السعادة
		11.488.535,22	10.000.000,00		تم فتح الأظرفة بتاريخ 2018/09/12	مشروع بناء ثانوية النور
		5.308.728	4.500.000,00		في طور المصادقة على الصفقة	مشروع إعادة بناء المدرسة الابتدائية الحريزي بحي السلام

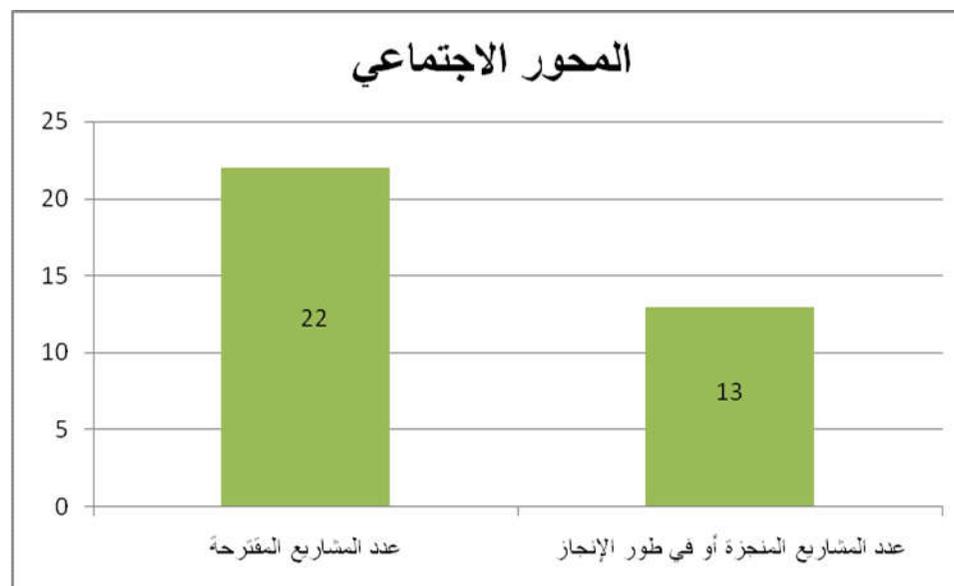

أما على مستوى الاجتماعي فقد بلغ عدد المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز 13 مشروعا من أصل 22 مشروعا واردا ببرنامج عمل الجماعة أي بنسبة إنجاز تصل إلى 59% بمبلغ استثماري ناهز حوالي **49.514.396,42** درهم .

معاينة ورش بناء سوق السمك



AOO ...	04/2019 -	17/04/2019	🔍
Travaux	Objet : Travaux de Construction de la Faculté Poly-disciplinaire à Ksar Kbir - 1ère Tranche	LARACHE	📅
19/03/2019	- LOT UNIQUE	11:00	📄
	Acheteur public : PRESIDENT DE L'UNIVERSITE ABDELMALEK ESSADI TETOUAN		👤



مشروع مكتبة احسيسن




معاينة البقعة الأرضية المخصصة
لبناء مكتبة احسيسن



ترصيف ساحة الثانوية المحمدية

المشروع	نسبة الانجاز المادي للمشروع (تقدم الأشغال)	نسبة الانجاز المالي	الغلاف المرصود (PAC)	مبلغ الصفقة	الاكراهات التي تحول دون انجاز المشروع في أجاله	الحلول المقترحة
المجال الصحي						
مشروع بناء مركز صحي حضري بتجزئة واد المخازن	طور الإنجاز (الدراسة)		4.000.000,00			
مشروع تهيئة مدخل المستشفى مع إحداث موقف للسيارات	100%	100%	2.000.000,00	4.108.932,00		

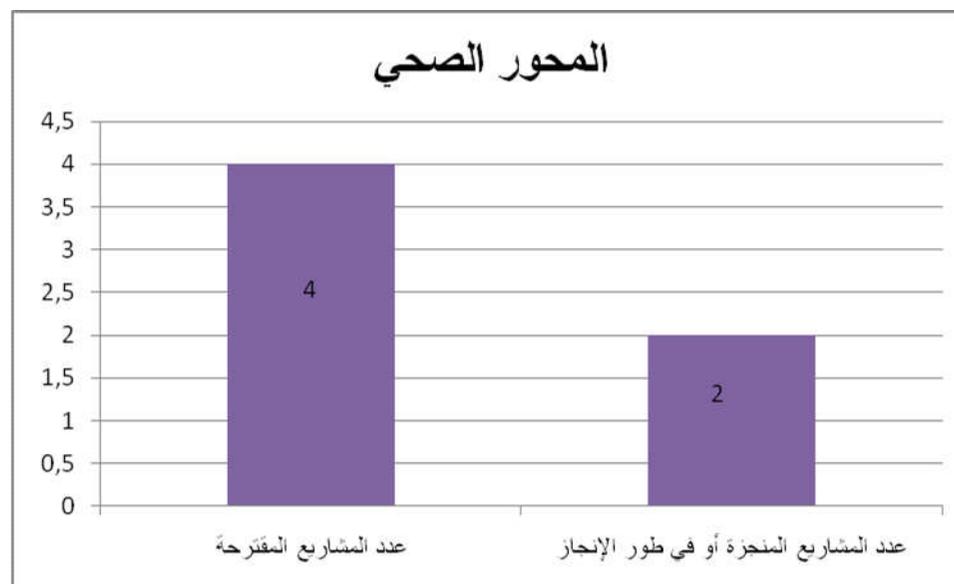


أما على مستوى الصحي فقد باشرت الجماعة بتنزيل مشروعات من أصل 04 مشاريع واردة ببرنامج عمل الجماعة ، حيث تم إنجاز دراسة مشروع بناء مركز صحي حضري بتجزئة واد المخازن في انتظار إعلان الصفقة، كما تم الانتهاء من مشروع تهيئة مدخل المستشفى مع إحداث موقف للسيارات .



مستشفى القصر الكبير

الحلول المقترحة	الاکراهات التي تحول دون انجاز المشروع في آجاله	مبلغ الصفقة	الغلاف المرصود (PAC)	نسبة الانجاز المالي	نسبة الانجاز المادي للمشروع (تقدم الأشغال)	المشروع
المجال الرياضي						
		3.631.146,00	3.757.572		طور الإنجاز (الصفقة و تم اختيار المقاوله)	مشروع إحداث ملعب القرب أولاد احميد
		11.297.682,00	60.000.000,00	47%	70%	إحداث ملعب بلدي كبير بطاقة استيعابية تلام حجم و إشعاع مدينة القصر الكبير مع تجهيزه بحلبة مطاطية لألعاب القوى تهيئة وتوسيع الملعب البلدي دار الدخان

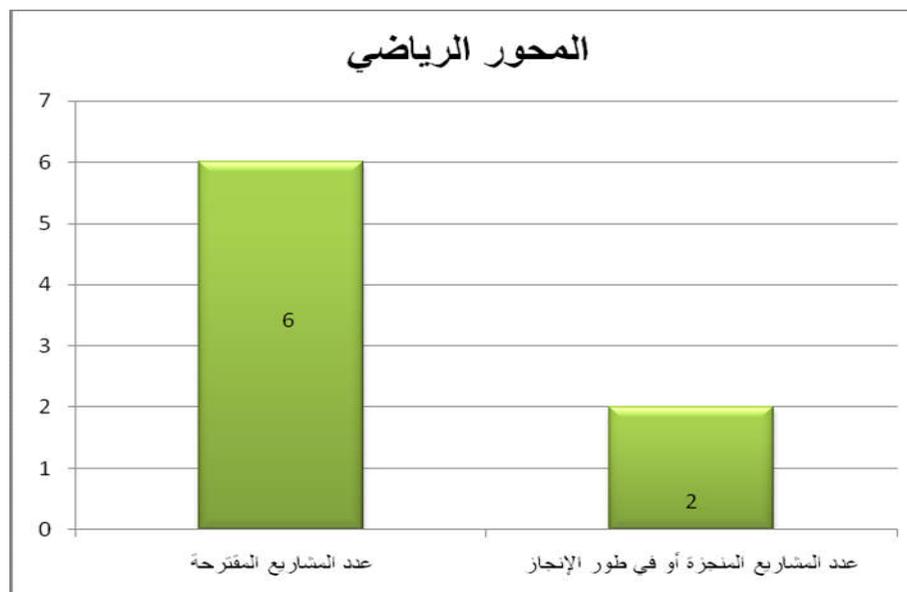

على المستوى الرياضي قامت الجماعة بتهيئة وتوسيع الملعب البلدي دار الدخان نظرا لعدم سماح الإمكانيات المتوفرة بإحداث ملعب بلدي كبير بطاقة استيعابية تلائم حجم و إشعاع مدينة القصر الكبير مع تجهيزه بحلبة مطاطية لألعاب القوى ، كما تم إعلان صفقة مشروع إحداث ملعب القرب أولاد احميد في انتظار انطلاق الأشغال.




تهيئة مدرجات و مرافق صحية للملعب البلدي




الملعب البلدي

الحلول المقترحة	الاکراهات التي تحول دون انجاز المشروع في أجاله	مبلغ الصفقة	الغلاف المرصود (PAC)	نسبة الانجاز المالي	نسبة الانجاز المادي للمشروع (تقدم الأشغال)	المشروع
مجال الثقافة و التراث						
			32.000.000,00		طور الإنجاز (الدراسة)	مشروع بناء مركب ثقافي (المسرح البلدي)

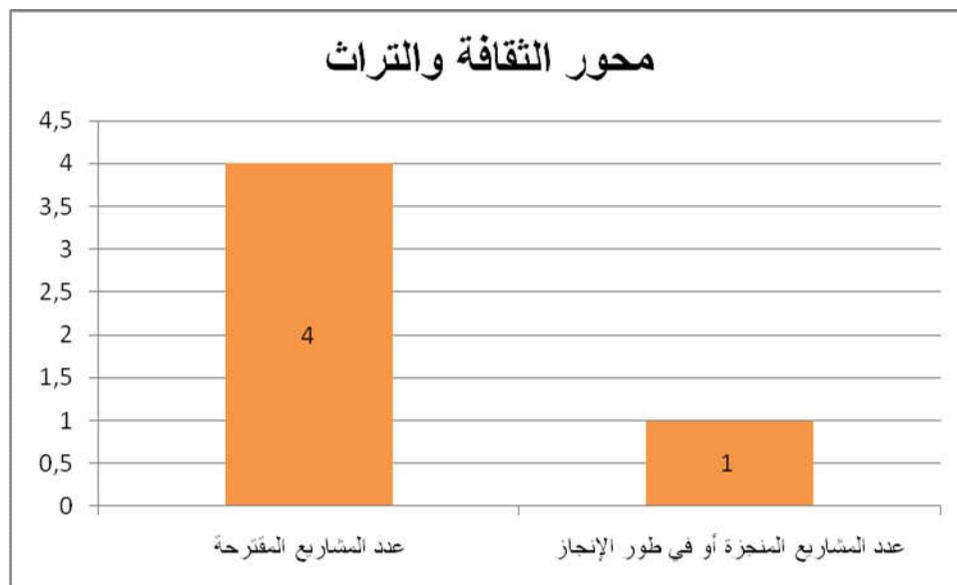

المشروع	نسبة الانجاز المادي للمشروع(تقدم الأشغال)	نسبة الانجاز المالي	الغلاف المرصود (PAC)	مبلغ الصفقة	الاكراهات التي تحول دون انجاز المشروع في أجاله	الحلول المقترحة
المجال البيئي						
مشروع ربط حي أولاد احميد والأحياء ناقصة تجهيز بشبكة التطهير السائل	طور الإنجاز		57.000.000,00			
مشروع إعادة تهيئة وإحداث حدائق وساحات عمومية بالمدينة (حديقة السعادة , دار الدخان , السلام , ساحة المرس). الإتارة العمومية بالطاقة الشمسية بحديقة 3 مارس تهيئة الساحات العمومية تهيئة الساحات العمومية بالأثاث الحضري	طور الإنجاز(الدراسة)	%100	20.000.000,00	269.888,00		
		%100		1.047.975,36		
		%100		1.411.920,00		
		%100		988.656,00		
مشروع تأمين ممرات سكة الحديد مع تحسين الجانب البيئي حولها بناء الجدار العازل للسكة الحديدية منشآت فنية أشغال إعادة تهيئة الممرات تحت أرضية (قرب محطة مولاي المهدي)	طور الإنجاز	%100	60.000.000,00	7.000.000,00		
		%100		6.000.000,00		
		50,08%		883.715,10		
المساهمة الإيجابية لإحداث مطرح النفايات مشترك بين الجماعات وضع برنامج للحاويات المنظمة لجمع النفايات الصلبة تستجيب للمتطلبات البيئية	المساهمة في إطار مجموعة الجماعات وادي المخازن					
مشروع التشجير بشراكة مع الجمعيات البيئية	طور الإنجاز		1.000.000,00			

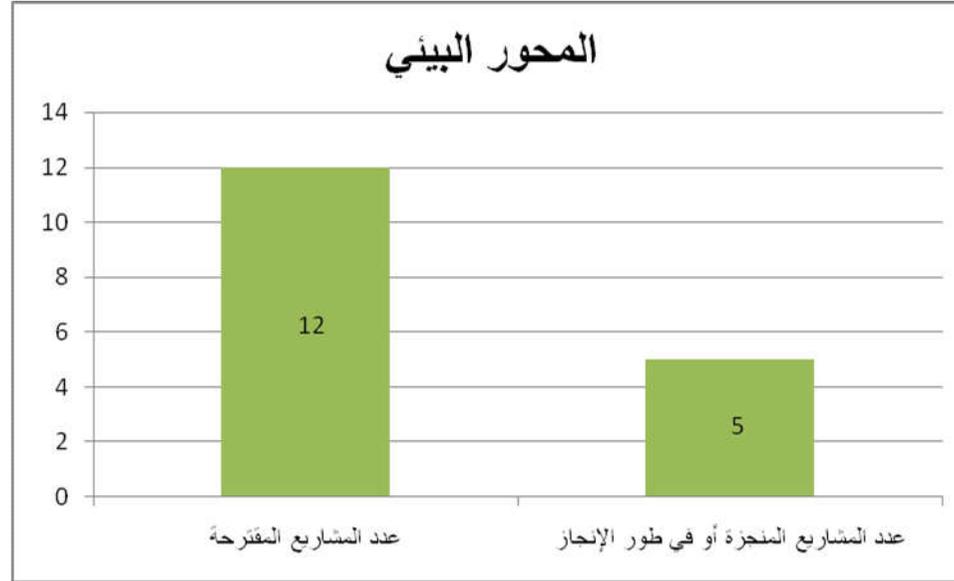

أما على المستوى البيئي فقد بلغ عدد المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز 5 مشاريع من أصل 12 مشروعاً وارداً ببرنامج عمل الجماعة أي بنسبة إنجاز تقارب **41,66%**.



إعادة تهيئة الممر تحت أرضي المؤدي لحي السلام (المرينة)



إنجاز جدار بالشباك على طول مقطع السكة الحديدية



أشغال التطهير السائل

مشاريع تهيئة المناطق الخضراء



SITUATION DES ETUDES DES OUVRAGES DE LA VILLE DE KSER LEKBIR

Passages à niveau	PK	Ouvrages prévus par la convention	Ouvrages arrêtés par les autorités	Situation des études	Montant prévu par la convention (HT)	Echéance prévisionnel de début des travaux
PNC Pk 99+800	99+800	Passerelle avec rampe	Passerelle avec rampe	Eude APS validée par les autorités. Appel d'offres en cours de lancement	3 000 000,00	Mai 2019 Délai = 6 mois
PNC Pk 100+100	100+100			Eude APS validée par les autorités. Appel d'offres en cours de lancement.	3 000 000,00	Mai 2019 Délai = 6 mois
PN 3039	100+475	Pont route	Pont route	Eude APS validée. Approfondissement de l'étude géotechnique en cours et l'APD en cours	20 000 000,00	Juin 2019 Délai = 12 mois
3040 P.P	102+123	Passerelle avec rampe	Pont route	Eude APS remise aux autorités pour validation.	3 000 000,00	04 mois après la validation des plans
3041 (gardé)	102+243	Pont route au PK102+000	Passage sous terrain/Passerelle	Eude APS en cours de mise au point	20 000 000,00	04 mois après la validation des plans
3042 P.P	102+661	Passerelle avec rampe	Passage sous terrain/Passerelle	Eude APS achevée et adressée aux autorités pour validation.	3 000 000,00	04 mois après la validation des plans
3044 P.P	103+430	A supprimer sans ouvrage (*)	-	-	-	04 mois après la validation des plans
PNC Pk 103+694	103+694	Escaliers au pont existant (*)	-	-	1 000 000,00	
Murs de clôture et amélioration de l'aspect environnemental des emprises ferroviaires				Travaux ACHEVES Marché N°67TS22/PIC/ST	7 000 000,00	Travaux Achevés Avancement 100%
TOTAL :					60 000 000,00	

(*) La commune a demandé un ouvrage pour piétons au lieu des escaliers prévus au niveau de l'ouvrage de l'Ex PN 3045
Le dossier correspondant leur a été adressé pour validation

مشاريع خارج برنامج عمل الجماعة

يضم هذا الجدول وضعية تقدم الأشغال المتعلقة بالمشاريع الغير مدرجة ببرنامج عمل الجماعة حيث بلغ مجموع الاعتمادات المعبنة حوالي 48.693.409,14 مليون درهم ، والتي كانت محور ترافعات المجلس لدى المؤسسات والقطاعات الحكومية المختصة ، كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي سيقوم السنة المقبلة بتعيين برنامج عمل الجماعة، الأمر الذي سيمكنه من دمج هذه المشاريع بوثيقة برنامج عمل الجماعة كما سيمكنه من إعادة تحديد أولوياته تماشياً مع السياق التنموي على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي وكذا مع تنزيل ورش اللاتمركز الإداري.

المشروع	نسبة الانجاز المادي للمشروع (تقدم الأشغال)	نسبة الانجاز المالي	مبلغ الصفقة
مشروع تهيئة مدخل القصر الكبير من جهة طريق تطفت	انطلاق الأشغال	0%	8.455.659,00
مشروع بناء وتوسعة سوق القرب بوشويكة	100%	50%	3.186.348,00
تهيئة فضاء خاص ببانعي العجائن	طور الإنجاز	0%	345.000,00
أشغال تهيئة وتجديد سوق الجملة	100%	100%	5.082.141,02
أشغال تهيئة وترميم مجزرة الأغنام والأبقار	100%	-	6.046.351,92
مجزرة الدواجن	80%	-	6.250.046,48
تهيئة وتأهيل سوق الماشية	70%	-	3.160.000,00
تهيئة وتأهيل سوق الحبوب	10%	-	8.400.000,00
مشروع تهيئة وإصلاح سوق سبينة	95%	40%	1.872.756,00
تحويل دار الشباب سيدي مظلوم إلى ملحقة النواة الجامعية	100%	100%	2.243.001,60
تنمية أشغال ملحقة النواة الجامعية	100%	100%	929.508,00
تجهيز دار الشباب حي السلام	100%	0%	824.148,00
أشغال الإنارة العمومية لملاعب القرب أولاد احمايد	100%	0%	434.220,00
أشغال تهيئة 5 ملاعب كرة القدم المصغرة	30%	0%	1.151.640,00
بناء قاعة مغطاة للتدريب	40%	14,30%	6.562.635,60
المجموع			48.693.409,14



سوق الجملة للخضر و الفواكه



سوق الجملة للخضر و الفواكه



تهينة واجهة سوق الحبوب القديم (سوق سبتة)



مجزرة اللحوم



مجزرة الدواجن
